Id		Opgavetilst	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1			Sáttmálasamráðingar	7 dage	to 07-01-16	fr 15-01-16
2			Skipanaruppskot	65 dage	ma 18-01-16	fr 15-04-16
3			Arbeiðstakarasáttmáli(	13 dage	ma 18-04-16	on 04-05-16
4			Projektering 1. Byggistig	147 dage	to 05-05-16	fr 25-11-16
5			Jarðarbeiði	100 dage	ma 01-08-16	fr 16-12-16
6			Útbjóðing, tilboð, samráðingar. 1. Byggistig	67 dage	ti 01-11-16	on 01-02-17
7			Tilrigging	11 dage	to 02-02-17	to 16-02-17
8			Fundamentir og lendisdekk	40 dage	fr 17-02-17	to 13-04-17
9			Ráhús	60 dage	fr 14-04-17	to 06-07-17
10			Sokkulbjálving og klæðing	30 dage	on 31-05-17	ti 11-07-17
11			Glasfasadur uttan	74 dage	to 06-07-17	ti 17-10-17
12			liðuggerð av tekjum til og við takdúk	30 dage	ma 04-09-17	fr 13-10-17
13			Liðuggerð av uttanum økið sunnanfyri bygningin	40 dage	on 12-07-17	ti 05-09-17
14			Uppseting av arbeiðsveggum ímillum grund, mið og hádeild	8 dage	ma 16-10-17	on 25-10-17
15			**Aptering innan av miðdeild**	**175 dage**	**to 26-10-17**	**on 27-06-18**
16			Yvirstoyping av hæddarskilnaðum	35 dage	to 26-10-17	on 13-12-17
17			Gólvsliping, viðgerð og avdekking	20 dage	on 13-12-17	ti 09-01-18
18			Trappur og girðingar	10 dage	on 10-01-18	ti 23-01-18
19			Tekniskar installatiónir	170 dage	to 26-10-17	on 20-06-18
20			Innveggir	30 dage	to 18-01-18	on 28-02-18
21			Loftir	25 dage	to 01-03-18	on 04-04-18
22			Innhurðar	15 dage	to 05-04-18	on 25-04-18
23			Máling	25 dage	to 26-04-18	on 30-05-18
24			Fast innbúgv	20 dage	to 31-05-18	on 27-06-18
25			Liðuggerð og reingerð	7 dage	to 28-06-18	fr 06-07-18
26			Avrigging	5 dage	ma 09-07-18	fr 13-07-18
27			Innflyting í miðdeild	5 dage	ma 16-07-18	fr 20-07-18
28			Projektering 2. Byggistig	153 dage?	on 01-02-17	fr 01-09-17
29			Útbjóðing, tilboð, samráðingar. 2. Byggistig	59 dage?	ma 16-04-18	to 05-07-18
30			Tilrigging	11 dage	fr 06-07-18	fr 20-07-18
31			Liðuggerð av útiøkið á Tekju	40 dage	ma 23-07-18	fr 14-09-18
32			**Aptering innan av Hádeild**	**240 dage**	**ma 23-07-18**	**ma 24-06-19**
33			Yvirstoyping av hæddarskilnaðum	30 dage	ma 23-07-18	fr 31-08-18
34			Gólvsliping, viðgerð og avdekking	20 dage	ma 03-09-18	fr 28-09-18
35			Trappur og girðingar	10 dage	ma 01-10-18	fr 12-10-18
36			Tekniskar installatiónir	186 dage	ma 15-10-18	ma 01-07-19
37			Hallargólv	40 dage	ma 08-10-18	fr 30-11-18
38			Innveggir	30 dage	ma 03-12-18	fr 11-01-19
39			Loftir	35 dage	ma 14-01-19	fr 01-03-19
40			Innhurðar	15 dage	ma 04-03-19	fr 22-03-19
41			Máling	30 dage	ma 25-03-19	fr 03-05-19
42			Fast innbúgv	30 dage	ma 06-05-19	fr 14-06-19
43			Liðuggerð og reingerð	7 dage	ma 17-06-19	ti 25-06-19
44			Niðurtøka av arbeiðsveggi ímillum há og miðdeild	2 dage	on 26-06-19	to 27-06-19
45			Avrigging	5 dage	fr 28-06-19	to 04-07-19
46			Innflyting í Hádeild	5 dage	fr 05-07-19	to 11-07-19
47			Projektering 3. Byggistig	120 dage	ma 04-09-17	fr 16-02-18
48			Útbjóðing, tilboð, samráðingar. 3. Byggistig	65 dage?	ma 01-04-19	fr 28-06-19
49			Tilrigging	11 dage	ma 01-07-19	ma 15-07-19
50			**Aptering innan av Hádeild**	**259 dage**	**ti 16-07-19**	**fr 10-07-20**
51			Yvirstoyping av hæddarskilnaðum	30 dage	ma 07-10-19	fr 15-11-19
52			Gólvsliping, viðgerð og avdekking	20 dage	ma 18-11-19	fr 13-12-19
53			Trappur og girðingar	10 dage	ti 16-07-19	ma 29-07-19
54			Tekniskar installatiónir	259 dage	ti 16-07-19	fr 10-07-20
55			Liðuggerð av uttanumøkið norðan fyri bygningin	50 dage	ma 29-07-19	fr 04-10-19
56			Innveggir	25 dage	ma 16-12-19	fr 17-01-20
57			Loftir	30 dage	ma 20-01-20	fr 28-02-20
58			Innhurðar	15 dage	ma 02-03-20	fr 20-03-20
59			Máling	30 dage	ma 23-03-20	fr 01-05-20
60			Fast innbúgv	30 dage	ma 04-05-20	fr 12-06-20
61			Liðuggerð og reingerð	7 dage	ma 15-06-20	ti 23-06-20
62			Niðurtøka av arbeiðsveggi ímillum grund og miðdeild	3 dage	on 24-06-20	fr 26-06-20
63			Avrigging	5 dage	ma 29-06-20	fr 03-07-20
64			Innflyting í grund deild	5 dage	ma 06-07-20	fr 10-07-20

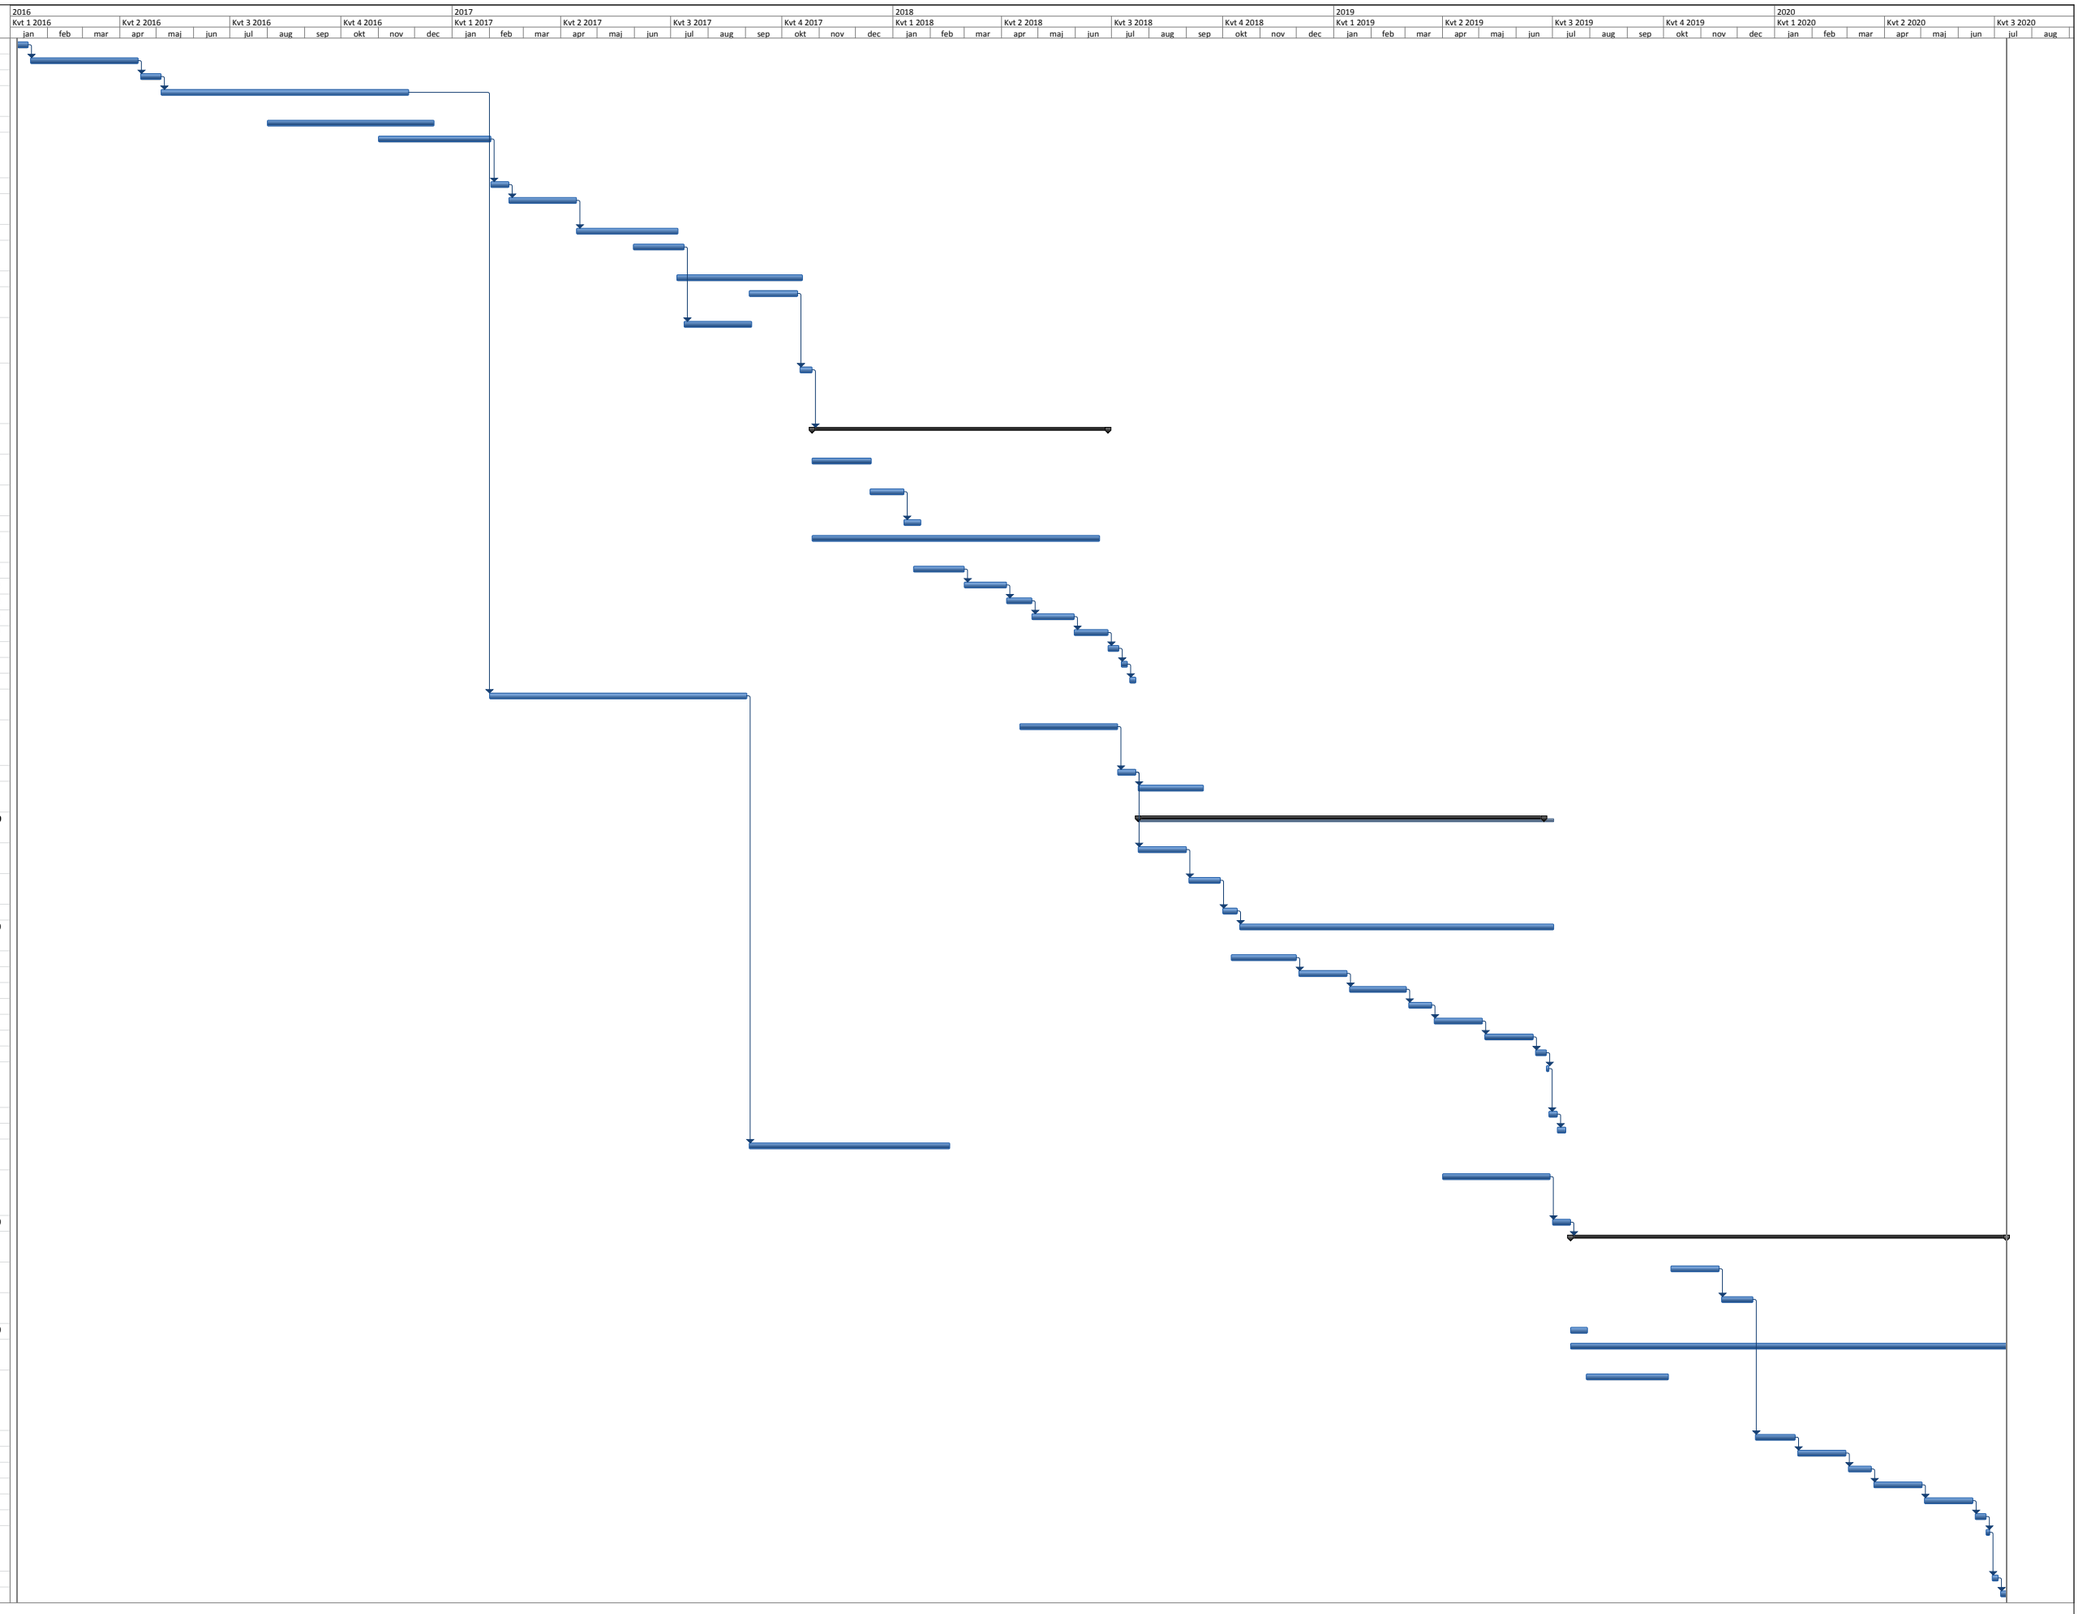

Projekt: Tíðarætlan.mpp
Dato: fr 18-12-15

Opgave — Milepæl — Projektoversigt — Ekstern milepæl — Inaktiv milepæl — Manuel opgave — Manuel oversigtsopløftning — kun start — Deadline
Opdeling — Hovedopgave — Eksterne opgaver — Inaktiv opgave — Inaktiv oversigt — Kun varighed — Manuel oversigt — Kun slutdato — Fremdrift
